




Reunión del Comité del Fondo Fiduciario del SCF
Ciudad de Washington (virtual)
25 de junio de 2021

**INFORME SOBRE LAS OPERACIONES
Y LOS RESULTADOS DEL PPCR
(RESUMEN)**

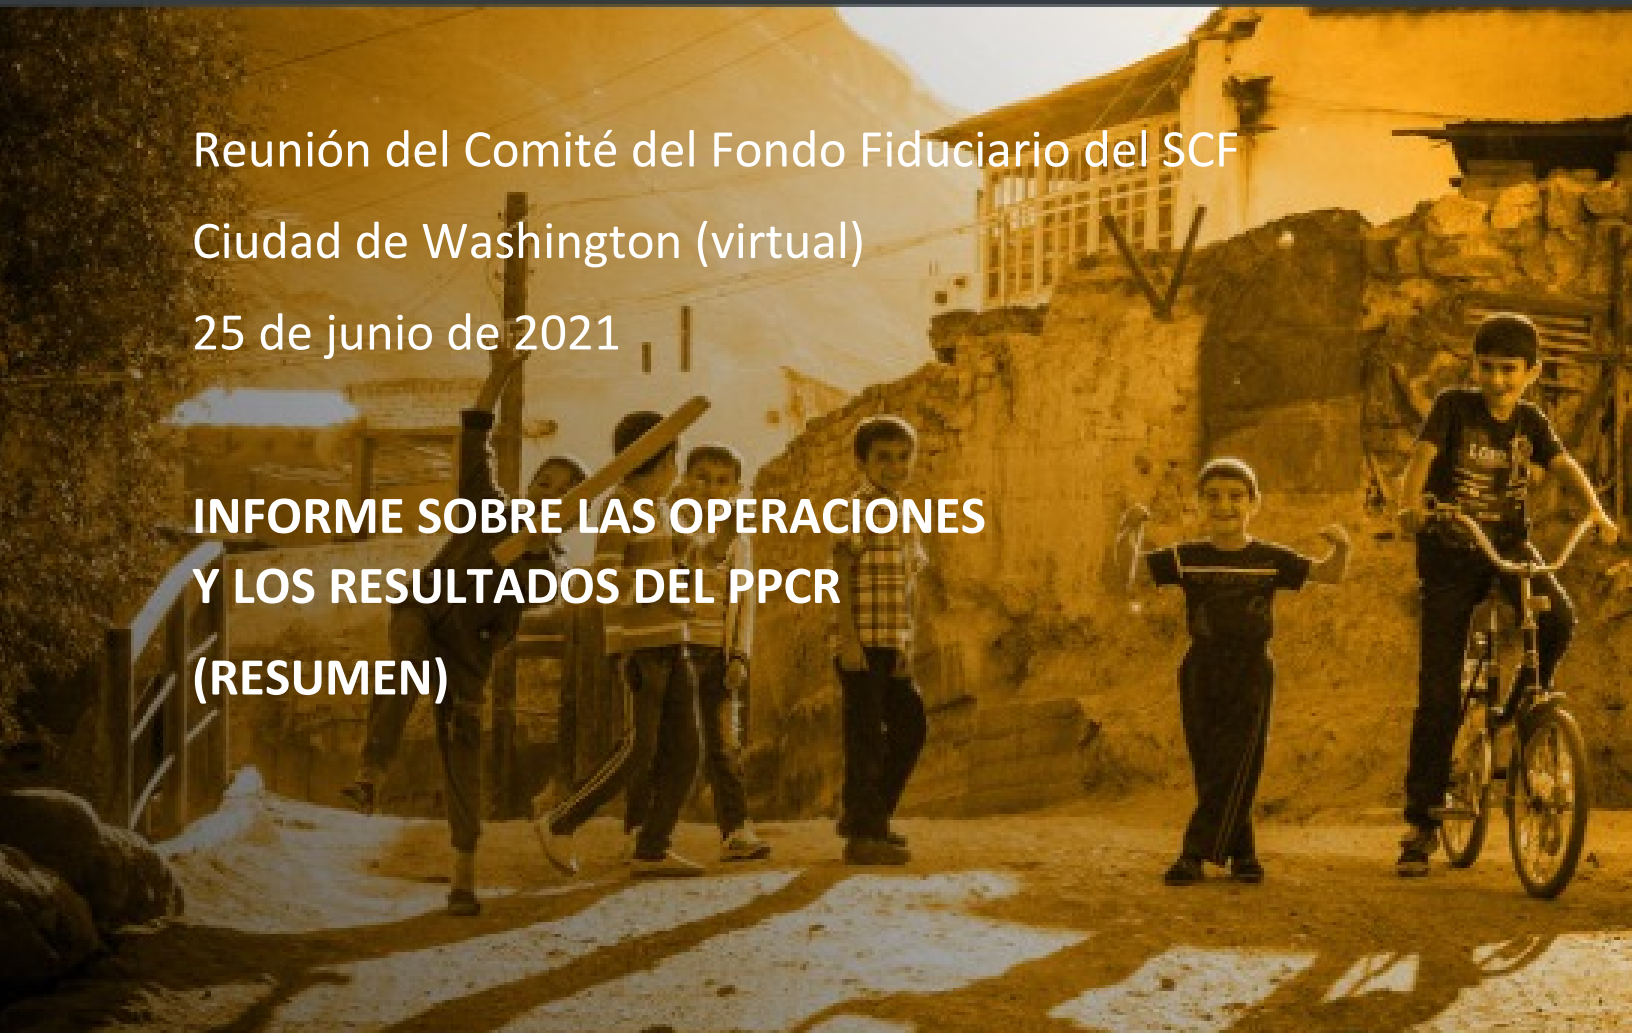

SCF/TFC.15/3.2

25 de mayo de 2021

DECISIÓN PROPUESTA

Tras examinar el documento SCF/TFC.15/3.2, *Informe sobre las operaciones y los resultados del PPCR*, el Comité del Fondo Fiduciario del Fondo Estratégico sobre el Clima (SCF) se muestra complacido por los avances logrados en la promoción de la labor del Programa Piloto sobre la Capacidad de Adaptación al Cambio Climático (PPCR) en los países piloto.

Asimismo, agradece el análisis realizado por la Unidad Administrativa de los Fondos de Inversión en el Clima (CIF), en colaboración con los bancos multilaterales de desarrollo (BMD), relativo a los logros y resultados, la disponibilidad de recursos, la revisión de los proyectos en tramitación y las actualizaciones de la cartera.

1 Introducción

1. En este *Informe sobre las operaciones y los resultados del PPCR* se identifican cuestiones estratégicas clave, se destacan las decisiones que adoptó el Subcomité del PPCR en el período entre sesiones y se presenta la situación actualizada de la totalidad de su cartera de programas y proyectos. La información sobre las operaciones abarca el período comprendido entre el 1 de julio de 2020 y el 31 de diciembre de 2020 (con actualizaciones adicionales al 31 de marzo de 2021 sobre disponibilidad de recursos). La información sobre los desembolsos abarca hasta el 30 de junio de 2020. Los datos sobre los resultados de los proyectos en ejecución corresponden al período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020.

2 Cuestiones estratégicas

2.1 Panorama general

2. El PPCR continúa avanzando a buen ritmo con sus operaciones. Al 31 de diciembre de 2020, el Comité Técnico del PPCR había aprobado un financiamiento de USD 996,2 millones para 70 proyectos. Los desembolsos de proyectos se incrementaron en un 22 %, de USD 588 millones el 30 de junio de 2019 a USD 717 millones el 30 de junio de 2020; en 19 proyectos se desembolsó el total de los montos de financiamiento del PPCR. Veinte proyectos han alcanzado una tasa de desembolso superior al 70 % de la asignación de fondos del PPCR. Los informes sobre resultados logran avances constantes, y los países y los BMD continúan informando sobre el progreso y los resultados obtenidos en los proyectos y la ejecución general de programas de los países.

2.2 Impacto de la COVID-19 en la cartera del PPCR

3. La COVID-19 continúa teniendo un impacto en los proyectos en ejecución del PPCR. Las pautas gubernamentales, incluidos el distanciamiento social, las restricciones para viajar y las limitaciones de grandes reuniones, han ralentizado las actividades de proyectos y extendido las fechas de cierre de proyectos. En promedio, la mayoría de los proyectos que experimentan dificultades de ejecución han modificado sus plazos de 4 a 12 meses. Algunos proyectos en tramitación del Programa de Desarrollo de Actividades para la Resiliencia (BDRP) también han ajustado las fechas objetivo para las aprobaciones de financiamiento. La Unidad Administrativa de los CIF está trabajando en estrecha colaboración con los BMD para continuar evaluando los riesgos que representa la COVID-19 para la cartera del PPCR y para hacer un seguimiento de los cambios en sus operaciones junto con sus iniciativas más generales de gestión de riesgos.

2.3 Disponibilidad de recursos del PPCR

4. Al 31 de marzo de 2021, el PPCR tenía un total de USD 1170 millones en financiamiento acumulado. Los compromisos de financiamiento totales alcanzaron los USD 1130 millones.
5. Dado que hay un saldo de fondos no sujetos a restricciones (descontadas las reservas) de USD 26,8 millones y compromisos previstos en el marco del PPCR por un valor de

USD 20 millones (USD 5,8 millones en recursos de capital y USD 14,2 millones en donaciones), el PPCR registra un superávit total de USD 6,8 millones (USD 6,7 millones en recursos de capital y USD 0,1 millones en donaciones) (véase el cuadro 1).

Cuadro 1. Cronograma de disponibilidad de recursos del PPCR
(en millones de USD, al 31 de marzo de 2021)

	Total	Otras formas de financiamiento	Donaciones
Saldo de fondos no sujetos a restricciones (C)	44,1	12,4	31,7
Reservas para programación futura	17,3		17,3
Saldo de fondos no sujetos a restricciones (C), descontadas las reservas	26,8	12,4	14,4
Total de compromisos previstos (D)	20,0	5,8	14,2
Recursos disponibles (C-D)	6,8	6,7	0,1

2.4 Gestión de la cartera de proyectos en tramitación

- Los proyectos en tramitación del PPCR se encuentran en las etapas finales de desarrollo. De los 84 proyectos de la cartera del PPCR, el Comité Técnico del PPCR había aprobado 70 proyectos para fines de diciembre de 2020. Catorce proyectos más en el marco del BDRP deben someterse a la aprobación del Comité Técnico. Los BMD están desarrollando propuestas para estos proyectos con el objetivo de completar la aprobación de financiamiento por parte del Comité Técnico del PPCR para fines de julio de 2021.
- También en el marco del BDRP, hay siete proyectos en reserva que requieren financiamiento en forma de donaciones por un total de USD 12,75 millones. Estos proyectos podrían recibir apoyo financiero cuando los fondos de donaciones estén disponibles en el marco del PPCR.

2.5 Seguimiento y presentación de informes

- En este período, los BMD y los países del PPCR pudieron informar sus datos de resultados en el Centro de Colaboración de los CIF (CCH). Diversas cuestiones (como los altos niveles de recambio del personal encargado del seguimiento y la presentación de informes en los países del PPCR y los desafíos de mantener el proceso de presentación de informes anuales y realizar capacitación presencial) llevaron a la Unidad Administrativa de los CIF a desarrollar un nuevo módulo de capacitación en línea para el seguimiento y la presentación de informes del PPCR con el objetivo de ayudar a los países a desarrollar su capacidad de llevar adelante actividades cruciales de seguimiento y presentación de informes en sus esfuerzos por impulsar la resiliencia al cambio climático. Hasta el momento, la Unidad Administrativa de los CIF ha realizado tres capacitaciones virtuales, con la participación de más de 50 profesionales del PPCR de Zambia, Santa Lucía y Haití.

9. Un análisis inicial de la cartera del PPCR, a partir de herramientas de modelado para estimar las contribuciones al empleo y la creación de valor económico, proporcionó datos únicos en su tipo sobre la cartera del PPCR. Sobre la base de este análisis, se inició la implementación de una evaluación más amplia de los impactos en términos de desarrollo en los CIF, con un enfoque en los cuatro programas actuales de estos fondos, y se espera que arroje conclusiones preliminares para fines de 2021. Esta evaluación de métodos combinados, realizada por una empresa de evaluación independiente, incluye modelos adicionales y estudios de casos de países para analizar más profundamente los impactos en el empleo y el desarrollo económico, al tiempo que amplía el análisis a otras áreas como el medioambiente, la salud, la competitividad del mercado o comercio, la seguridad y los impactos sociales, incluidos el género y la inclusión.

3 Temas transversales

3.1 Gestión de los conocimientos y alianzas

10. La serie Conocimientos para la Resiliencia del PPCR se relanzó en 2020 para sintetizar aún más la experiencia y el conocimiento sobre el terreno a partir de la ejecución de proyectos del PPCR y para orientar a los responsables de adoptar decisiones y a los expertos en la adaptación (incluidos los profesionales, los Gobiernos asociados, los BMD, las organizaciones de la sociedad civil [OSC] y las instituciones de financiamiento para el clima) en la integración de medidas de adaptación y resiliencia en planes y proyectos de desarrollo. La Unidad Administrativa de los CIF se encuentra en proceso de desarrollar estudios de casos y reseñas sobre aprendizaje para la serie Conocimientos para la Resiliencia que se enfocan en proyectos de infraestructura del PPCR y en la participación de las partes interesadas locales en la ejecución de proyectos del PPCR. Estos estudios de casos y reseñas sobre aprendizaje se lanzarán en julio de 2021.
11. Al reconocer el papel fundamental de la información y los servicios meteorológicos, climáticos e hídricos a favor de la adaptación y el desarrollo de la resiliencia al cambio climático, en octubre de 2020, [los CIF se unieron a la Alianza para el Desarrollo Hidrometeorológico](#). También iniciaron una colaboración con el grupo de Salud, Población y Nutrición del Banco Mundial para desarrollar una serie de productos de conocimientos sobre la COVID-19 y atención médica climáticamente inteligente, valoración económica de la salud y el clima, y perfiles de países sobre el clima y la salud.
12. Debido a la COVID-19, todas las actividades de intercambio de conocimientos del PPCR se llevaron a cabo de forma virtual. Desde julio de 2020, se organizaron ocho eventos del PPCR (o relacionados con la resiliencia), en los que participaron unas 200 personas. Estos eventos incluyeron el laboratorio *Climate Delivery Lab*, de la Iniciativa Mundial sobre la Ciencia de la Entrega (GDI) y los CIF, sobre tecnologías de riego en Níger, un seminario web de difusión de un estudio sobre el fortalecimiento de la capacidad de adaptación en el sector hídrico boliviano y dos talleres de inicio para una revisión de aprendizaje de los proyectos de servicios climáticos e hidrometeorológicos respaldados por los CIF. Estos también incluyeron cuatro reuniones de grupos de interés para la resiliencia de la Alianza de Aprendizaje para el Cambio Transformador.

13. En octubre de 2020, la Iniciativa Especial para la Evaluación y el Aprendizaje de los CIF elaboró y publicó una [reseña de aprendizaje](#), junto con un [resumen](#) y un [blog](#), que se basa en la evidencia y la experiencia reciente de los CIF sobre cómo las inversiones relacionadas con el clima pueden respaldar las iniciativas de los países para recuperarse de la COVID-19.

3.2 Género

14. Se observa una mejora en la calidad del SPCR en el marco del PPCR respecto de la línea de referencia de junio de 2014 en las tres áreas de los indicadores de la hoja de calificación (es decir, la inclusión de análisis de género específicos para cada sector, las actividades orientadas a las mujeres y los indicadores de seguimiento desglosados por sexo). En cuanto a los proyectos, el desempeño disminuyó levemente con respecto a la línea de referencia (del 78 % al 77 % de toda la cartera de proyectos del PPCR) en el área de análisis de género específicos para cada sector, pero aumentó en las otras áreas de la hoja de calificación.

3.3 Gestión de riesgos

15. El riesgo de ejecución del PPCR disminuyó considerablemente de alto a bajo, debido a que uno de los 65 proyectos (que representa USD 10 millones en financiamiento para programas aprobados por BMD) fue considerado riesgoso en este aspecto. El riesgo de ejecución del programa ha sido considerado alto para los ciclos contemplados en los últimos seis informes.

4 Estado de la cartera del PPCR

16. Al 31 de diciembre de 2020, el PPCR tenía una asignación total de USD 1010 millones para 84 proyectos en tramitación. Esto incluye 60 proyectos en el marco de los SPCR aprobados de los países piloto iniciales, 4 proyectos correspondientes al Programa de Financiamiento Reservado para el Sector Privado (PSSA) y 20 proyectos en virtud del BDRP. En el cuadro 2 se resume la situación de la cartera. La cartera consta de 68 proyectos en curso y finalizados y se ha desembolsado un total acumulado de USD 716,6 millones para 63 de ellos.

Cuadro 2. Panorama general de la cartera del PPCR (en millones de USD, al 31 de diciembre de 2020)

	Asignación indicativa para los proyectos en tramitación				Financiamiento aprobado		Desembolso
	Total	Plan de inversión	PSSA	BDRP	Comité	BMD	
Financiamiento del PPCR	1012,3	966,3	19,8	26,2	996,2	993,7	716,6
Número de proyectos	84	60	4	20	70	68	63

Nota: Los montos incluyen las donaciones para la preparación de proyectos.

17. **Cofinanciamiento:** El total del cofinanciamiento previsto para toda la cartera del PPCR, que comprende 84 proyectos, asciende a más de USD 2500 millones, que se traducen en un

coeficiente de cofinanciamiento de 1:2,5. Los BMD siguen siendo la mayor fuente de cofinanciamiento, seguidos de los Gobiernos receptores, los donantes bilaterales y de otro tipo, y el sector privado.

18. Aprobaciones del Subcomité PPCR y de los BMD: Desde el último informe, el Comité Técnico del PPCR aprobó seis proyectos por un monto total de USD 8,79 millones y las juntas o la administración de los BMD aprobaron cuatro proyectos por un total de USD 7,58 millones. Todos estos proyectos son en virtud del BDRP.
19. Ejecución y desembolsos de los proyectos: A finales del 30 de junio de 2020, se estaban desembolsando fondos del PPCR para 63 proyectos y los desembolsos acumulados alcanzaron los USD 717 millones. El nivel de desembolsos de los proyectos como porcentaje del financiamiento aprobado por los BMD sigue aumentando y ahora llega al 72 %.
20. Finalización de proyectos: Durante el período que abarca el informe, se completaron 10 proyectos del PPCR, con lo que ascendió a 21 el número total de proyectos finalizados.

5 Resultados

21. A pesar de que la pandemia de COVID-19 ha causado perturbaciones en la ejecución de los proyectos de los BMD, el PPCR ha logrado avances considerables hacia sus objetivos de programa. Entre los resultados obtenidos y aquellos logrados en el año del informe 2020 (AI 20) hasta el 31 de diciembre de 2020 se incluyen los siguientes:
 - Inclusión del cambio climático en 637 planes de desarrollo nacional, sectorial y local/comunitario, lo que representa el 94 % del objetivo total de 681 planes. Del AI 2019 al AI 2020, se añadieron dos nuevos planes que incorporaron consideraciones sobre cambio climático.
 - Se impartió capacitación sobre temas relacionados con el clima a 241 715 personas (119 % de las 203 641 personas previstas a través de 37 proyectos aprobados por los BMD en 18 países y 2 regiones). Entre el AI 2019 y el AI 2020, recibieron capacitación 12 814 personas, entre beneficiarios gubernamentales y no gubernamentales, como OSC, propietarios de pequeñas empresas y emprendedores. Los temas incluían el alcantarillado y la gestión de las aguas residuales, la gestión forestal, la bioingeniería, la conservación del suelo y el agua, y la incorporación de la perspectiva de género en la adaptación.
 - Se han generado 668 productos, estudios o plataformas de conocimientos (casi el 98 % del objetivo total de 682) en respaldo de las iniciativas de fortalecimiento de la capacidad de los países. Esto incluye 59 nuevos productos de conocimientos creados entre el AI 2019 y el AI 2020.
 - Se han restaurado más de 186 576 hectáreas de tierras degradadas mediante prácticas sostenibles de gestión de la tierra y el agua (más del 100 % de las 185 379 hectáreas previstas). Entre el AI 2019 y el AI 2020, más de 9558 hectáreas se incluyeron en prácticas más sostenibles.

- Se han construido o puesto en funcionamiento 2272 estaciones de servicios hidrometeorológicos y climáticos (estaciones agrometeorológicas, hidrológicas y meteorológicas), de las 2443 previstas, en siete países (93 % de avance). Entre el AI 2019 y el AI 2020, se instalaron o pusieron en funcionamiento 33 estaciones de servicios hidrometeorológicos y climáticos.
- Se han construido o rehabilitado 2476 kilómetros de carreteras aptas para uso en condiciones climáticas adversas (85 % de los 2920 kilómetros previstos). Entre el AI 2019 y el AI 2020, se añadieron 388 kilómetros de caminos resilientes, lo que representó un aumento del 19 %.
- Se han construido más de 7643 edificios climáticamente inteligentes de pequeña escala (escuelas, hospitales y refugios para desastres) (53 % de los 14 525 edificios previstos). Entre el AI 2019 y el AI 2020, se pusieron a disposición de las comunidades beneficiarias 2154 obras adicionales de infraestructura de pequeña escala e inteligentes en relación con el clima.
- Se han creado cinco servicios de financiamiento para la adaptación al clima, que respaldan a 8374 hogares y empresas (92 % de los 9072 hogares y empresas previstos). Entre el AI 2019 y el AI 2020, un total de 2034 hogares y empresas recibieron apoyo de estos servicios.
